

LIVRABLE 2

Work Breakdown Structure Décomposition hiérarchique des tâches + Dictionnaire WBS

Arbre WBS — Vue hiérarchique complète


Structure à 3 niveaux : 5 phases → lots de travaux → tâches élémentaires

Phase (N1)	Lot (N2)	Tâches (N3)
1. Spécification	1.1 Analyse & Architecture	1.1.1 Rédaction Mini-CDC 1.1.2 Définition WBS & dictionnaire 1.1.3 Estimation COCOMO / Analogie 1.1.4 Diagramme de Gantt
2. Conception	2.1 Réseau PERT et Architecture Technique 2.2 Wireframes et Product Backlog v1	2.1.1 Réseau PERT 2.1.2 Architecture technique 2.2.1 Wireframes (3 écrans) 2.2.2 Product Backlog v1
3. Développement	3.1 Module Authentification 3.2 Système de Réservation 3.3 Infrastructure et Gestion de Flotte	3.1.1 Auth & Gestion des comptes 3.1.2 Recherche de véhicules 3.2.1 Réservation en ligne 3.2.2 Gestion des réservations 3.3.1 Publication de voitures 3.3.2 Intégration Firebase & API
4. Tests	4.1 Tests Unitaires & Qualité Code 4.2 Stabilisation	4.1.1 Tests unitaires (Jest) 4.1.2 Tests d'intégration 4.2.1 Correction des bugs
5. Déploiement	5.1 Configuration Production & Build 5.2 Entraînement et Finalisation	5.1.1 Déploiement Expo / Firebase 5.1.2 Documentation finale 5.2.1 Préparation soutenance S12

Dictionnaire WBS


Code	Livrable	Responsable	Durée	Prédécesseur	Critère de fin
1.1.1	Rédaction MiniCDC	lymane	5j	----	Signé par l'enseignante
1.1.2	Définition WBS & dictionnaire	Hajar	3j	1.1.1	Validées par l'équipe
3.1.1	Auth & Gestion des comptes	lymane	8j	2.2.2	Login / Log out Ok en test

3.1.2	Recherche de véhicules	Hajar	7j	3.1.1	3 filres fonctionnels OK
3.2.2	Gestion des réservations	Achraf	8j	3.2.1	Réservation crée en BDD
3.3.1	Publication de voitures	lymane	5j	3.2.2	Announce visible après validation
4.1.1	Tests unitaires (Jest)	Khaoula	4j	3.3.2	Suite de tests automatisés
5.1.1	Déploiement Expo	Achraf	3j	4.2.1	App installable
5.1.2	Documentation finale	Khaoula	5j	5.1.1	Rapport de clôture

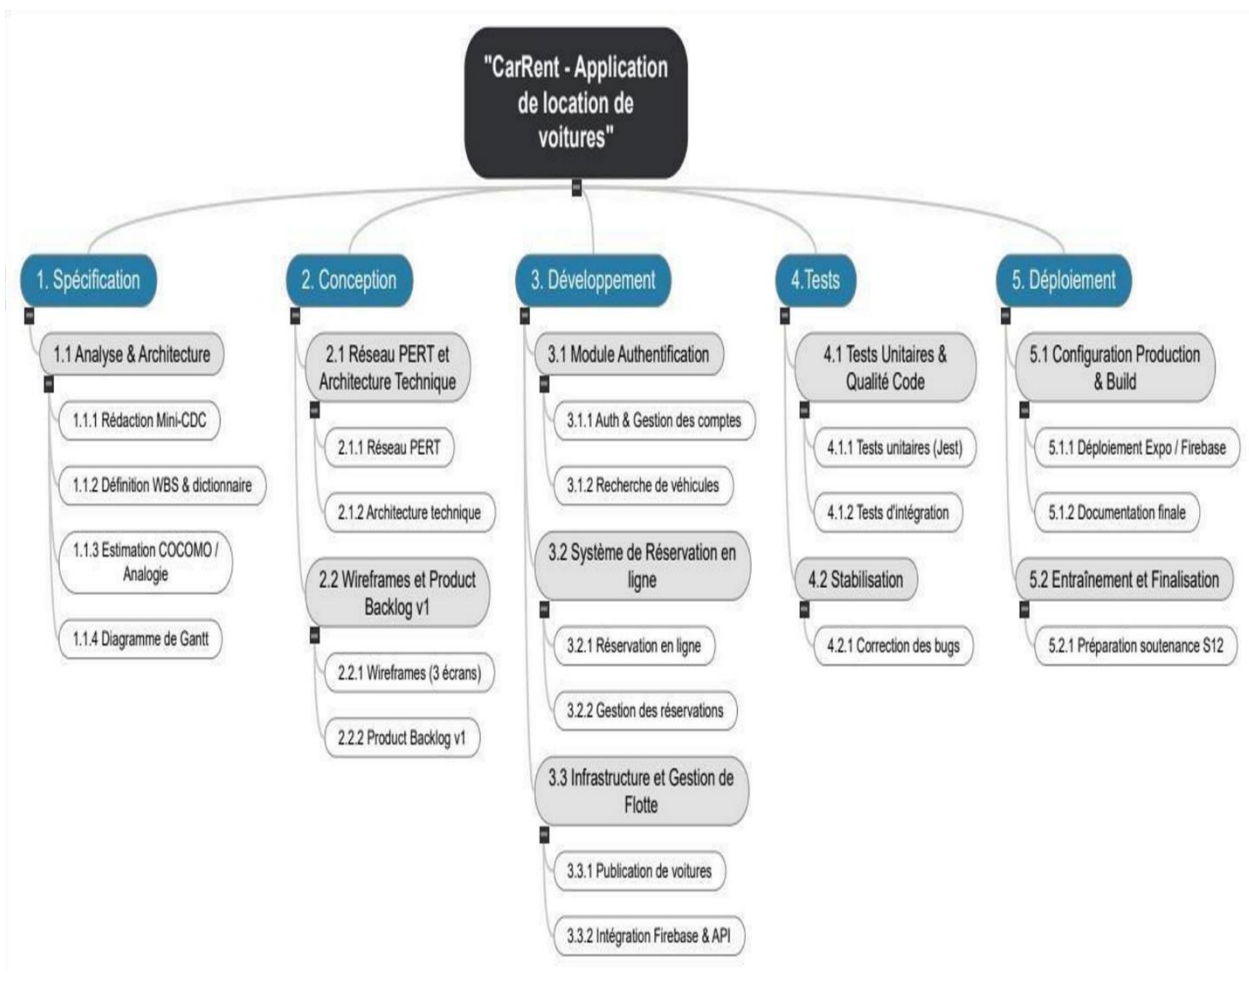

LIVRABLE 4

Diagramme de Gantt Planification + Tableau des marges + Jalons

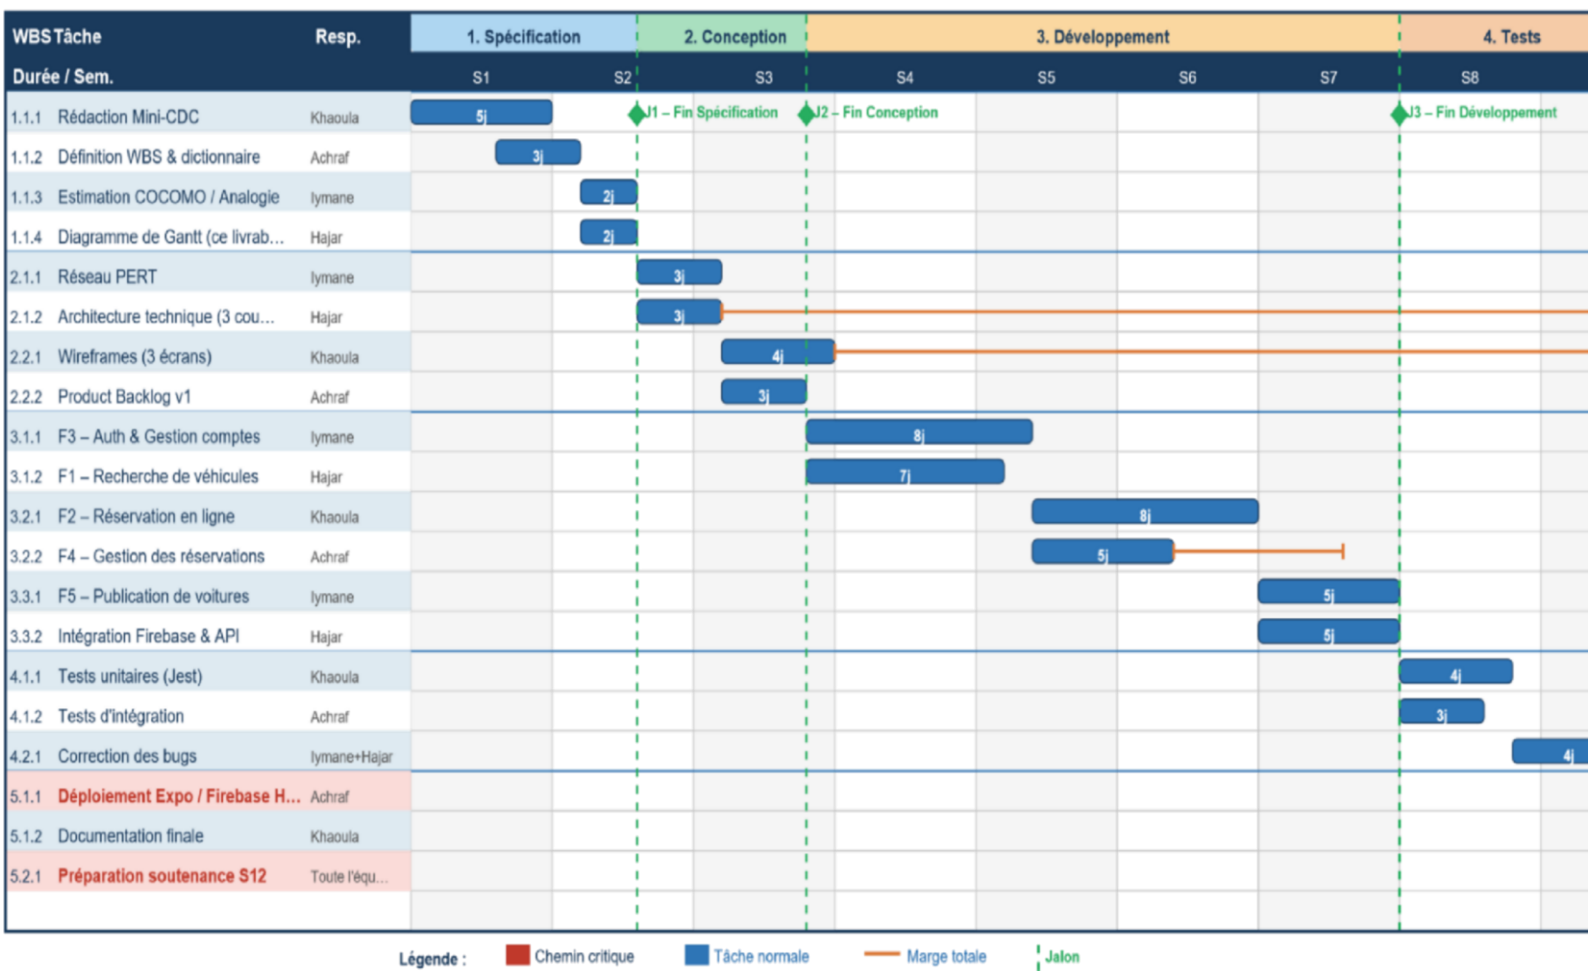

1.1.1	Cahier des charges validé	5	1	1	0	Oui
1.1.2	Maquettes UI (3 écrans)	3	6	6	0	Oui
2.1.1	Module Firebase Auth	5	9	14	5	NON
2.2.1	Recherche avec filtres	5	14	14	0	Oui
2.3.1	Formulaire réservation	3	19	19	0	Oui
2.3.4	Email de confirmation	2	22	22	0	Oui
2.4.1	Publication véhicule	4	14	21	7	Non
3.1	Rapport tests unitaires	4	24	24	0	Oui
4.1	APK déployé + Doc	3	38	38	0	Oui

J1 – Fin Spécification	5	À valider
J2 – Fin Conception	8	À valider
J3 – Fin Développement	24	À valider
J4 – Fin Tests	29	À valider
J5 – Livraison finale (S12)	32	À valider

